



МИНТРАНС РОССИИ



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО  
РОСАВТОДОР

# Эффективная организация кассового освоения средств федерального бюджета в рамках реализации федеральных программ дорожной деятельности

ЛАЗАРЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Заместитель Председателя Правительства Ульяновской области – Министр  
транспорта Ульяновской области

2

## УЧАСТИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ



Национальный проект «Безопасные качественные дороги»  
**2019-2024**



Федеральная программа «Содействие развитию автомобильных дорог  
регионального, межмуниципального значения и местного значения»  
**2021-2023**



Государственная программа «Комплексное развитие  
сельских территорий»  
**2019-2024**


3

## ФИНАНСИРОВАНИЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИЗ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА



Общий объем финансирования федеральных программ за период 2019-2024 гг. составил **15,2 млрд рублей**

Финансирование программ (млн. рублей)

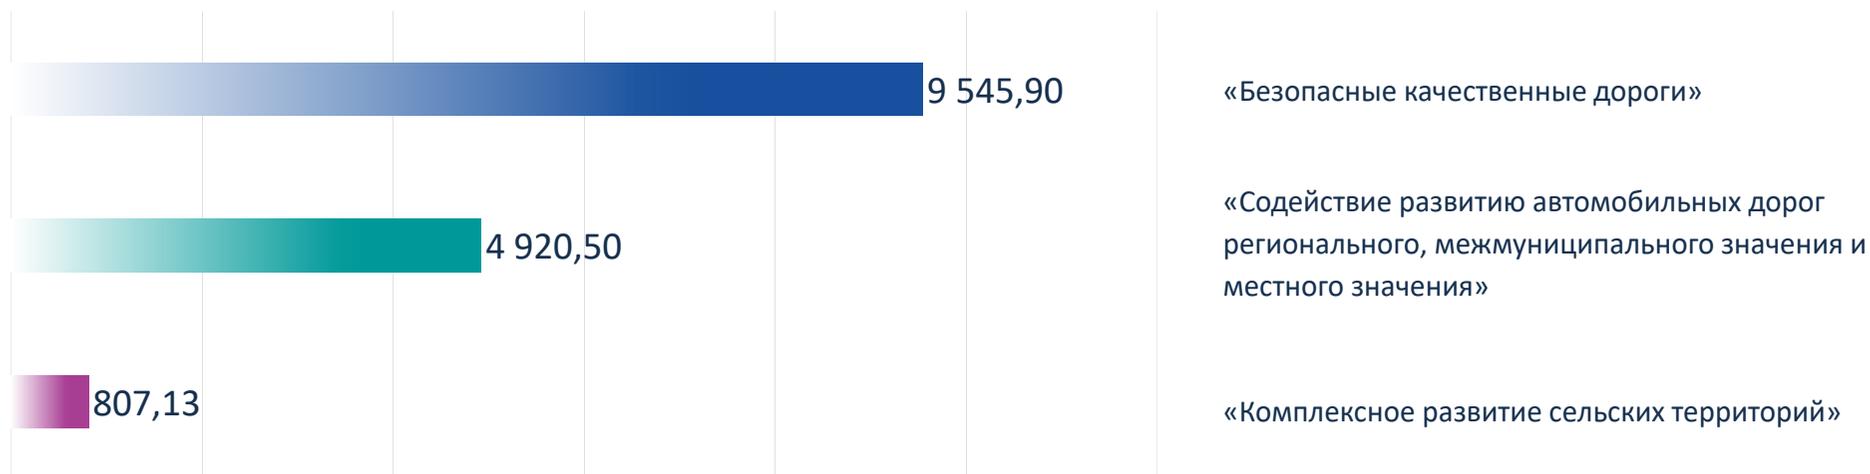

## ОБЪЕМ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА ПЕРИОД 2019-2024 ГГ.



### Приведены в нормативное состояние:

**431** участок автомобильных дорог  
протяженностью более **930** км

### Капитально отремонтированы:

**27** искусственных сооружений  
протяженностью **930,55** п.м

### Построены и реконструированы :

**9** участков автомобильных дорог проходящих  
по сельским территориям.  
протяженностью **26,83** км




1

Своевременное заключение контрактов на выполнение дорожных работ позволяет:

- **спланировать графики** выполнения строительно-монтажных работ
- **эффективно распределить денежные средства** с ежемесячной разбивкой на весь финансовый год



## Контрактация (100%)

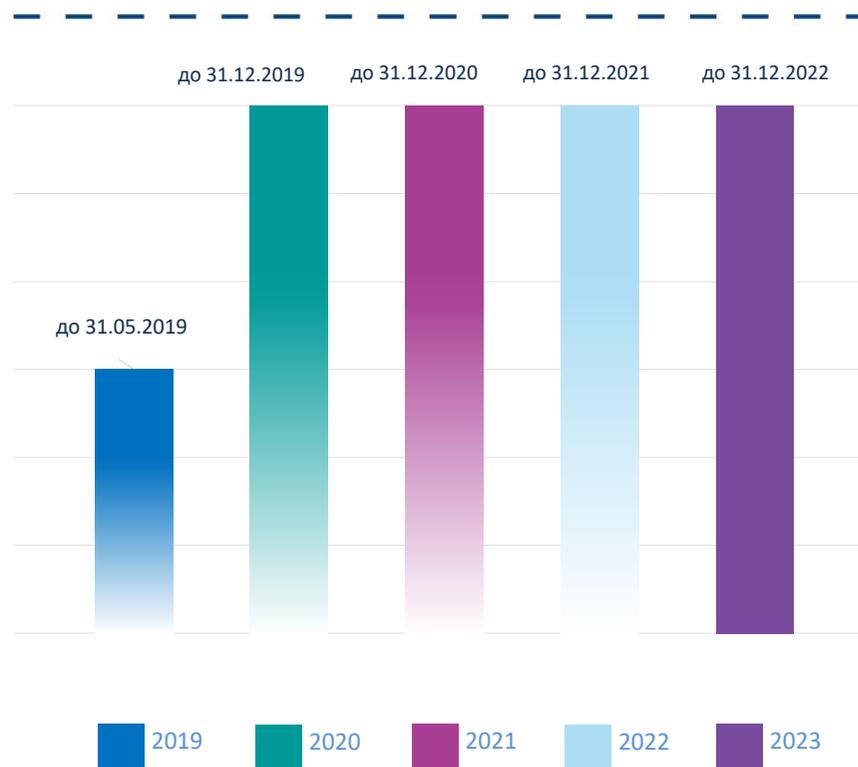

# 6 ПРИНЦИПЫ ГРАМОТНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ



## 2 Постоянный контроль за подрядными организациями

- До начала дорожно-строительного сезона проводится **семинар-совещание**, где до участников доводятся все требования в части **соблюдения принципов контрактной системы и финансовой дисциплины**
- В течение дорожно-строительного сезона на ежемесячной основе проводятся совещания по обсуждению хода выполнения и соблюдения графика работ **с оценкой и анализом наличия рисков нарушения условий заключённого контракта**



## 3 Проведение заседаний ведомственного проектного офиса

- **До 10 числа** февраля, мая, августа, ноября основной повесткой является рассмотрение наличия **рисков неосвоения ПОФР**



## 4 Направление в установленные сроки заявки в Федеральное дорожное агентство на уточнение кассового плана

- внутренними приказами Министерства транспорта Ульяновской области закреплены **ответственные сотрудники** за подготовку заявки **не позднее 15 числа месяца**, установленного Росавтодором для ее предоставления





Кассовое освоение ПОФР, %			Корректировка ПОФР
2020	I кв.	0	—
	II кв.	100	—
	III кв.	100	—
	IV кв.	100	—
2021	I кв.	100	—
	II кв.	100	—
	III кв.	100	—
	IV кв.	100	—
2022	I кв.	100	—
	II кв.	100	—
	III кв.	100	отказ – 74,01 млн. руб.
	IV кв.	100	—
2023	I кв.	100	отказ - 61,77 млн. руб.
	II кв.	100	—
	III кв.	100	—
	IV кв.	100	—



# **XI** МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА
